

Ingeniería y Calidad de Software

Resumen de estudio de las unidades 1, 2, 3 y 5, que son las que entran en el parcial de Regularización, recortado a los documentos y páginas del temario de la cátedra. Está pensado para leerse de corrido: cada capítulo abre explicando por qué el tema existe antes de entrar en las definiciones, y las tablas aparecen sólo donde hay algo que comparar. El orden es temático, no el del examen. Para el detalle completo de cada tema está la wiki ([ICS.md](#)); para practicar, el banco de preguntas ([banco-preguntas.md](#)).

CONTENIDO

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 El parcial y su temario | 10 El proyecto y su planificación |
| 2 Qué significa calidad en software | 11 La estimación del esfuerzo |
| 3 El software como objeto de ingeniería | 12 Los ciclos de vida |
| 4 CMMI: qué es y para qué sirve | 13 Verificación y validación |
| 5 Anatomía de un área de proceso | 14 La organización de las pruebas |
| 6 Los niveles de madurez | 15 Las técnicas dinámicas |
| 7 La gestión de procesos de la organización | 16 Las técnicas estáticas: revisiones |
| 8 Activos de proceso y productos de trabajo | 17 Confusiones frecuentes |
| 9 El proceso de desarrollo: SPEM y RUP | |

1. El parcial y su temario

El parcial de Regularización es el **sábado 26 de septiembre a las 9:30**, es **presencial** y **no es a libro abierto**. Se aprueba con el **60 % del total de puntos**. En los años anteriores fue un cuestionario de opciones múltiples.

Entran las unidades **1, 2, 3 y 5**, y de cada una sólo los documentos y páginas que lista el temario de la cátedra. Este resumen sigue exactamente ese recorte:

UNIDAD	QUÉ ENTRA	CAPÍTULOS
1 — Modelos de calidad	Introducción a la calidad · Guía de ingeniería del software · CMMI: componentes de un área de proceso y niveles de madurez	2 a 6
2 — Gestión de procesos	Áreas OPE, OPD y OT, sin subprácticas · Presentación de Proceso y RUP, págs. 1 a 46	7 a 9
3 — Gestión de proyectos	Áreas PP y PMC · Guía práctica de gestión de proyectos · Análisis de puntos función (metodología y glosario)	10 y 11
5 — Verificación y validación	Áreas VER y VAL · Guía de verificación y validación · Principios de Myers · Derivación de casos de prueba desde casos de uso	12 a 16

Quedan **afuera** la unidad 4 (gestión de requerimientos), la Guía avanzada de gestión de proyectos, la Guía de mejores prácticas de calidad de producto y, dentro de RUP, los objetivos de cada fase y los propósitos de cada disciplina. De las áreas de proceso que no están en el temario —REQM, PPQA, CM, MA, RSKM, RD— alcanza con saber a qué nivel de madurez pertenecen.

2. Qué significa calidad en software

La palabra calidad arrastra un problema: todos creen saber qué quiere decir, y cada uno entiende algo distinto. En la materia se trabaja con una idea central —**calidad es idoneidad de uso**— y tres definiciones que la precisan desde ángulos diferentes.

La definición **clásica**, de Juran, la plantea en dos mitades: las características del producto que satisfacen las necesidades del cliente, y la **inexistencia de deficiencias**. Un producto puede tener todas las funciones pedidas y aun así fallar la segunda mitad.

CMMI la define como la capacidad de un conjunto de características inherentes de un producto, componente o **proceso** de satisfacer por completo los requisitos del cliente. Lo importante acá es que incluye al proceso: para CMMI, un proceso también tiene calidad.

ISO habla del conjunto de propiedades y características que le confieren aptitud para satisfacer necesidades **explícitas o implícitas**. La palabra que aporta es *implícitas*: hay expectativas que el cliente nunca escribió y que igual espera que se cumplan.

2.1 De qué depende la calidad

Cuatro elementos la determinan: los **procesos y buenas prácticas** que se siguen, las **herramientas** disponibles, las **personas** que hacen el trabajo, y las **medidas y métricas** con las que se controla. Ninguno alcanza por sí solo. Un equipo excelente con un proceso caótico produce resultados irrepetibles, y un proceso impecable no compensa a un equipo sin formación.

2.2 Tres tipos de calidad de producto

No toda la calidad se ve desde afuera, y esa distinción explica por qué a veces un sistema que "anda bien" es un problema.

La **calidad interna** es la que **el cliente no percibe**: facilidad de mantenimiento, claridad del código, respeto de los estándares, reusabilidad. No la ve, pero la paga: es la que determina cuánto cuesta cada cambio futuro.

La **calidad externa** es la visible: que el producto cumpla los requerimientos acordados.

La **calidad de uso** es la que algunos llaman *calidad futura*. Es la que no se tuvo en cuenta y aparece recién cuando el software se usa de verdad: el sistema pasa todas las pruebas, se entrega, y a la media hora de operación real se nota el problema que nadie había previsto.

2.3 Los tres niveles de gestión de la calidad

La calidad se puede gestionar en tres escalas distintas, y cada una tiene sus herramientas.

A nivel de **producto** se gestiona con pruebas ejecutadas en paralelo a cada etapa del desarrollo. A nivel de **proyecto** se gestiona controlando las fases y las áreas de gestión de ese proyecto en particular. A nivel de **proceso** se gestionan las áreas de proceso de **toda la organización** mediante una metodología.

Ese tercer nivel es el que ocupa la mayor parte de la materia, y es donde juega CMMI. La apuesta de fondo es que **la calidad de un producto está muy influenciada por la calidad del proceso empleado para desarrollarlo y mantenerlo**: si el proceso es bueno, los productos buenos dejan de ser casualidad.

3. El software como objeto de ingeniería

Antes de hablar de procesos conviene entender por qué el software necesita una ingeniería propia y no le sirven las de otras disciplinas.

Software = programas + datos + documentos. Es un elemento **lógico**, no físico.

Esa naturaleza lógica trae cuatro consecuencias que condicionan todo lo demás.

El software se desarrolla, no se fabrica. No hay línea de producción: cada producto se construye para los requisitos únicos de un cliente. No se pueden amortizar costos repitiendo unidades, porque no hay unidades que repetir.

El recurso principal son las personas, y no son intercambiables con el tiempo. Agregar gente no acelera un proyecto de forma lineal: el desarrollo requiere coordinación y comunicación, y cada integrante nuevo no es productivo de inmediato y además consume tiempo de los que ya están. Por eso es falso el principio de que "las personas y el tiempo son intercambiables".

El software no se estropea, pero se deteriora. Un engranaje se desgasta por uso; el software no. Lo que lo degrada son los **cambios**: cada modificación de mantenimiento tiene probabilidad de introducir defectos nuevos, y con los años el producto acumula complejidad y fragilidad.

La reutilización está lejos de su potencial. Identificar componentes reutilizables es difícil justamente porque cada producto se construye para requisitos únicos.

3.1 Qué es la ingeniería del software

Ingeniería del software (IEEE): aplicación de un enfoque **sistemático, disciplinado y cuantificable** al desarrollo, operación y mantenimiento del software.

Las tres palabras importan. *Sistemático* excluye improvisar; *disciplinado* excluye abandonar el método cuando aprieta el tiempo; *cuantificable* excluye opinar sin medir.

Se suele representar como una **tecnología multicapa**: sobre una base de **compromiso con la calidad** se apoyan los **procesos**, sobre ellos los **métodos**, y encima las **herramientas**. El orden no es decorativo: comprar herramientas sin proceso debajo no produce calidad.

3.2 Las etapas y el mantenimiento

Las etapas clásicas son: análisis de requisitos, especificación, diseño y arquitectura, programación, **prueba** y mantenimiento. La etapa que comprueba que el software realiza correctamente las tareas indicadas en la especificación es la de **prueba**.

El mantenimiento no es una sola cosa. Distinguir los cuatro tipos es una de las preguntas recurrentes de la materia:

TIPO	QUÉ PERSIGUE
Correctivo	Corregir errores detectados en el producto
Evolutivo (perfectivo)	Incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias para cubrir la expansión o el cambio en las necesidades del usuario
Adaptativo	Modificaciones que responden a cambios del entorno donde opera el sistema: hardware, software de base, gestores de base de datos, comunicaciones
Preventivo	Mejorar la calidad interna y la mantenibilidad, sin cambio funcional visible

3.3 Los principios de la disciplina

De la lista de principios que circula en la materia, dos aparecen una y otra vez como correctos: **haz de la calidad la razón de trabajar y probar, probar y probar**. Y tres aparecen como distractores porque enuncian exactamente lo contrario de lo que sostiene la disciplina: que las personas y el tiempo son intercambiables, que conviene hacerlo rápido primero y correcto después, y que hay que forzar el mismo modelo de ciclo de vida en todos los proyectos.

4. CMMI: qué es y para qué sirve

CMMI son las siglas de *Capability Maturity Model Integration*: modelo de madurez de capacidades integrado. No es una metodología ni un manual de procedimientos. Es una **guía de buenas prácticas** que no dice *cómo* hacer las cosas, sino **qué** hay que lograr.

Esa distinción es la clave para entender el modelo entero. CMMI define objetivos; cada organización decide con qué prácticas los alcanza, y puede usar prácticas propias distintas de las que el modelo sugiere, siempre que cumpla el objetivo.

Trabajar con un modelo probado da tres cosas que una organización sola tarda años en construir: la **experiencia acumulada** de otras empresas, un **lenguaje y una visión común** dentro de la organización, y un **punto de partida** para no inventar desde cero. Los resultados que se le atribuyen son menos defectos, menos tiempo de entrega, menor costo, más satisfacción del cliente y más beneficios.

4.1 Área de proceso

Área de proceso: grupo de prácticas relacionadas que, implementadas conjuntamente, satisfacen un conjunto de objetivos importantes para la mejora en esa área.

CMMI define **22 áreas de proceso**, repartidas en los niveles de madurez 2 a 5. Cada una cubre un aspecto del trabajo: planificar proyectos, gestionar requerimientos, verificar productos, formar gente.

5. Anatomía de un área de proceso

Toda área de proceso está construida con las mismas piezas, y esas piezas tienen distinto peso. Entender cuál es obligatoria y cuál no es probablemente el concepto más preguntado de la materia.

CATEGORÍA	QUÉ ES	QUÉ INCLUYE
Requeridos	Lo que la organización debe lograr para satisfacer el área. Es la base de las evaluaciones	Metas específicas (SG) y metas genéricas (GG)
Esperados	Lo que puede implementar para lograr lo requerido. Se admiten alternativas propias	Prácticas específicas (SP) y prácticas genéricas (GP)
Informativos	Material que ayuda a entender cómo aproximarse a lo requerido y lo esperado	Subprácticas, productos de trabajo típicos, ampliaciones, elaboraciones de prácticas genéricas, notas, ejemplos, referencias, declaración de propósito, áreas relacionadas

ATENCIÓN Lo **requerido son sólo las metas**. Las prácticas —aunque el modelo las liste y las explique— son **esperadas**, no obligatorias. Una organización puede sustituir una práctica por otra si con ella alcanza la misma meta.

5.1 Qué significa "genérico"

Un componente es **genérico** cuando la misma declaración se aplica a **múltiples áreas de proceso**. Las metas y prácticas específicas son propias de un área; las genéricas se repiten en todas.

El papel de las genéricas es tratar la **institucionalización**: que el proceso no dependa de la buena voluntad de quien lo ejecuta, sino que esté incorporado a la manera de trabajar de la organización. Esa es la respuesta cuando preguntan qué componentes tratan la institucionalización.

5.2 La numeración

Las metas se numeran secuencialmente: SG1, SG2, GG1. Las prácticas llevan dos números, SP x.y, donde **x es el número de la meta** a la que pertenecen e **y el número de secuencia** dentro de esa meta. Así, SP 2.3 es la tercera práctica de la segunda meta específica.

Saber leer la numeración sirve para descartar opciones: si un área tiene dos metas específicas, una opción que diga SP 3.1 es imposible.

6. Los niveles de madurez

CMMI organiza la mejora en cinco escalones. Cada uno describe un estado de la organización, no una lista de tareas cumplidas.

NIVEL	NOMBRE	CÓMO SE RECONOCE
1	Inicial	Caos: se hace lo que se puede. Hay intentos de normalizar, pero bajo estrés se abandonan . Predomina la <i>gestión del héroe</i> : alguien salva el proyecto a pulmón. El éxito no es repetible
2	Gestionado	Los procesos se planifican y se monitorizan , y se institucionalizan : no se abandonan bajo presión. Hay planes, indicadores, seguimiento. Los procedimientos pueden ser distintos en cada proyecto
3	Definido	Existe un conjunto de procesos estándar de la organización y cada proyecto adapta el suyo desde ahí, siguiendo guías de adaptación . Todos trabajan de la misma manera. El rendimiento es predecible, pero sólo cualitativamente
4	Gestionado cuantitativamente	Se gestiona con datos históricos y estadística . Se tratan las causas especiales de variación. El rendimiento pasa a ser predecible cuantitativamente
5	En optimización	Mejora continua . Se atacan las causas comunes de variación y se cambia el proceso para mejorar su rendimiento

6.1 Las dos comparaciones que hay que poder explicar

Nivel 2 frente a nivel 3: el alcance de los estándares. En nivel 2 cada proyecto puede tener sus propios procedimientos; lo que se exige es que los tenga, los siga y los sostenga. En nivel 3 los procedimientos **se adaptan desde el conjunto estándar de la organización**, y por lo tanto son consistentes entre proyectos salvo por las diferencias que las guías de adaptación permitan. Además, en nivel 3 los procesos se gestionan más proactivamente, usando la comprensión de las interrelaciones entre actividades.

Nivel 4 frente a nivel 5: el tipo de variación que se trata. El nivel 4 ataca las **causas especiales** —las anomalías puntuales— y logra predictibilidad estadística. El nivel 5 ataca las **causas comunes**, las que están incorporadas al proceso mismo, y para eliminarlas **cambia el proceso**.

6.2 Cómo se avanza: las reglas del modelo escalonado

De estas tres reglas salen casi todos los ejercicios de niveles.

Primera: para estar en un nivel hay que satisfacer todas las áreas de ese nivel y de los anteriores. Si falta una sola área, no se está en ese nivel. Una organización que cumple perfectamente las áreas de nivel 3 pero incumple una de nivel 2 no está en nivel 3 ni en nivel 2: está en **nivel 1**, que es el nivel por defecto porque no exige nada.

Segunda: los niveles son acumulativos. Alcanzar un nivel superior no exime de las metas de los anteriores. Una organización nivel 5 sigue planificando y monitorizando proyectos todos los días. Si dejara de hacerlo, se caería hasta nivel 1.

Tercera: se puede instanciar un área de nivel superior al propio si el contexto de negocio lo justifica, pero se corre el riesgo de intentar prácticas **sin la base institucional que las soporte**. Eso funciona hasta que aparece el estrés, que es justamente cuando más se las necesita.

6.3 Madurez y capacidad

CMMI admite dos formas de mirar el progreso.

La **madurez**, que es la representación **por etapas**, mide a la **organización entera** contra los conjuntos fijos de áreas de cada nivel. Es la que se certifica y la que usan todos los ejercicios de la materia.

La **capacidad**, que es la representación **continua**, mide el nivel alcanzado en **un área de proceso puntual**, con independencia del resto. Sirve para que la organización elija en qué área quiere crecer primero, según lo que le duela al negocio.

6.4 Qué áreas hay en cada nivel

Las 22 áreas se reparten así entre los niveles 2 a 5:

NIVEL ÁREAS DE PROCESO

2	PP Planificación de proyecto · PMC Monitorización y control del proyecto · REQM Gestión de requerimientos · MA Medición y análisis · PPQA Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto · CM Gestión de configuración · SAM Gestión de acuerdos con proveedores
3	OPF Enfoque en procesos · OPD Definición de procesos · OT Formación organizativa · VER Verificación · VAL Validación · RD Desarrollo de requerimientos · TS Solución técnica · PI Integración de producto · RSKM Gestión de riesgos · IPM Gestión integrada de proyecto · DAR Análisis de decisiones y resolución
4	OPP Rendimiento de procesos de la organización · QPM Gestión cuantitativa de proyecto
5	OID Innovación y despliegue en la organización · CAR Análisis causal y resolución

En negrita, las siete que el temario desarrolla. Del resto alcanza con el nivel: es lo que hace falta para resolver un caso como "cumple todo el nivel 3 pero le falta MA", que deja a la organización en nivel 1 porque MA es de nivel 2.

ATENCIÓN La traducción castellana del CMMI que usa la cátedra tiene una errata: la carátula del área de **OT** dice "nivel de madurez 4". Las tablas del mismo libro y la presentación de la cátedra la ponen en **nivel 3**, que es lo correcto.

7. La gestión de procesos de la organización

Tres áreas de nivel 3 se ocupan de los procesos de la organización como un todo, y son las que más se confunden entre sí porque sus nombres se parecen. La forma más rápida de separarlas es por el verbo que las define.

OPF diagnostica y despliega. **OPD** define y guarda. **OT** capacita.

El temario incluye las tres áreas completas **salvo las subprácticas y la extensión IPPD**. Lo que hay que dominar de cada una es el **propósito** y sus **metas y prácticas específicas**, que se listan a continuación con el texto oficial.

7.1 OPF – Enfoque en procesos de la organización

Propósito: planificar, implementar y desplegar las mejoras de procesos de la organización, basadas en una comprensión completa de las **fortalezas y debilidades actuales** de los procesos y de los activos de proceso.

Es el área del **diagnóstico y la mejora**. Evalúa dónde está parada la organización —incluso comparándose con otras organizaciones—, arma los planes de acción para corregir las debilidades que encuentra, y después des-

pliega los cambios e incorpora lo aprendido. Sus tres metas siguen exactamente ese recorrido:

- **SG 1 Determinar las oportunidades de mejora de procesos.** SP 1.1 Establecer las necesidades de procesos de la organización · SP 1.2 **Evaluar los procesos** de la organización · SP 1.3 Identificar las mejoras de procesos.
- **SG 2 Planificar e implementar las mejoras de procesos.** SP 2.1 **Establecer planes de acción de procesos** · SP 2.2 Implementar los planes de acción de procesos.
- **SG 3 Desplegar los activos de proceso e incorporar las lecciones aprendidas.** SP 3.1 Desplegar los activos de proceso · SP 3.2 Desplegar los procesos estándar · SP 3.3 Monitorizar la implementación · SP 3.4 **Incorporar las experiencias relativas al proceso en los activos de proceso** de la organización.

7.2 OPD – Definición de procesos de la organización

Propósito: establecer y mantener un conjunto **usable** de **activos de proceso** de la organización y de **estándares del entorno de trabajo**.

Es el área que **define y guarda**. Todo lo que la organización tiene para que sus proyectos lo reutilicen —el proceso estándar, los modelos de ciclo de vida, las reglas para adaptarlos, el repositorio de mediciones, la biblioteca de documentos— lo establece OPD. Tiene una sola meta dentro del temario, y cada práctica crea uno de esos activos:

- **SG 1 Establecer los activos de proceso de la organización.** SP 1.1 Establecer los **procesos estándar** · SP 1.2 Establecer las descripciones de los **modelos de ciclo de vida** · SP 1.3 Establecer los **criterios y las guías de adaptación** · SP 1.4 Establecer el **repositorio de medición** de la organización · SP 1.5 Establecer la **biblioteca de activos de proceso** · SP 1.6 Establecer los **estándares del entorno de trabajo**.

La segunda meta, *facilitar la gestión IPPD*, pertenece a la extensión IPPD y no entra.

ATENCIÓN Cuando un enunciado menciona un **repositorio de medidas ligado a los procesos estándar de la organización**, la respuesta es **OPD** (SP 1.4), no MA. MA es de nivel 2 y mide **el proyecto**; el repositorio de la organización es un **activo**, y los activos son de OPD.

7.3 OT – Formación organizativa

Propósito: desarrollar las **habilidades y el conocimiento** de las personas para que puedan realizar sus **roles** eficaz y eficientemente.

Primero se construye la capacidad de formar y después se forma. Un punto que suele preguntarse es el reparto de responsabilidades: la organización cubre las necesidades de formación **comunes** a los proyectos, y cada proyecto cubre las **específicas** suyas. Las necesidades **estratégicas** miran varios años hacia adelante; el **plan táctico** baja eso a cursos concretos.

- **SG 1 Establecer una capacidad de formación organizativa.** SP 1.1 Establecer las necesidades de formación **estratégicas** · SP 1.2 Determinar qué necesidades de formación son **responsabilidad de la organización** · SP 1.3 Establecer un **plan táctico** de formación · SP 1.4 Establecer la capacidad de formación.
- **SG 2 Proporcionar la formación necesaria.** SP 2.1 Impartir la formación · SP 2.2 Establecer los **registros** de formación · SP 2.3 Evaluar la **eficacia** de la formación.

7.4 Las prácticas que se cruzan entre OPF y OPD

En los exámenes aparece la misma lista de prácticas preguntada dos veces, una pidiendo las de OPF y otra las de OPD. La regla para no mezclarlas: si la práctica **crea** un activo, es OPD; si **evalúa, planifica, despliega o actualiza** lo que ya existe, es OPF.

PRÁCTICA	ÁREA
Establecer el repositorio de medición de la organización	OPD
Establecer las descripciones de los modelos de ciclo de vida	OPD
Establecer los criterios y las guías de adaptación	OPD
Evaluar los procesos de la organización	OPF
Establecer planes de acción de procesos	OPF
Incorporar las experiencias relativas al proceso en los activos de proceso	OPF

8. Activos de proceso y productos de trabajo

Esta distinción es corta de explicar y sorprendentemente fácil de errar, porque los dos conceptos se refieren a documentos que a veces tienen nombres casi idénticos.

Un **activo** es un artefacto que la organización produce **para ser usado en las tareas de los proyectos**. Un **producto de trabajo** es el resultado concreto de una tarea **de un proyecto**.

La pregunta que resuelve cualquier caso es: *¿esto existe para ser usado en muchos proyectos, o salió de uno?*

Las señales de **activo** son las palabras plantilla, guía, directriz, modelo y estándar. También son activos las **herramientas que la organización adquiere** en lugar de desarrollar, junto con su documentación: el manual de usuario del compilador Java es un activo, porque no es producto de ningún proyecto.

Las señales de **producto de trabajo** son las referencias a un proyecto concreto: "del cliente", "del sistema desarrollado". Una minuta, el código fuente, una regla de negocio, la descripción del proceso de negocio del cliente.

El par que fija el criterio es este: la **plantilla de manual de instalación** es un activo —es el molde, y pertenece a la organización—, mientras que el **manual de instalación del sistema desarrollado para el cliente** es un producto de trabajo —es lo moldeado, y pertenece al proyecto.

9. El proceso de desarrollo: SPEM y RUP

Los capítulos anteriores hablaron de procesos en abstracto: que hay que definirlos, guardarlos y mejorarlos. Este capítulo baja a cómo se **escribe** un proceso concreto: con qué elementos se describe, quién hace qué, y qué material de apoyo lo acompaña.

9.1 Por qué gestionar procesos

Las organizaciones concentran su mejora en tres **dimensiones críticas**: las **personas**, los **métodos y procedimientos**, y las **herramientas y el equipamiento**. Los procesos son lo que sostiene a las tres: permiten alinear el

modo de operar de la organización, incorporar el conocimiento sobre cómo hacer mejor las cosas, aprovechar mejor los recursos y entender las tendencias de la propia actividad.

Las áreas de **gestión de procesos** de CMMI contienen las actividades **transversales a los proyectos**: definir, planificar, desplegar, implementar, monitorizar, controlar, evaluar, medir y mejorar los procesos. Se dividen en **básicas** —OPF, OPD y OT, las del capítulo 7— y **avanzadas** —OPP y OID—.

9.2 SPEM

SPEM (*Software Process Engineering Meta-Model*): estándar de la OMG —el mismo consorcio que mantiene UML— que establece los elementos clave para representar métodos, ciclos de vida, técnicas, roles, actividades, procesos, metodologías y plantillas de la ingeniería del software.

Es un **meta-modelo**: no describe un proceso en particular, sino el vocabulario con el que se describe cualquier proceso. Por eso su alcance se limita a los **elementos mínimos** necesarios, sin características de un dominio o disciplina en particular, y sirve para procesos de distintos estilos, culturas, niveles de formalismo y ciclos de vida. No es un lenguaje de modelado de procesos en general: está orientado al software.

Lo que aporta es facilitar la **comprensión y la comunicación** entre personas, facilitar la **reutilización**, dar soporte a la **mejora** y a la **gestión** de procesos, y guiar su **automatización**.

La idea central es que todo proceso se representa respondiendo tres preguntas:

PREGUNTA	ELEMENTO	QUÉ REPRESENTA
¿Quién?	Rol	Quién hace el trabajo
¿Qué?	Producto de trabajo	Las entradas que usan las tareas y las salidas que producen
¿Cómo?	Tarea	El esfuerzo a realizar

Además, SPEM define cuatro **niveles de detalle** para representar ese esfuerzo, de mayor a menor. El **delivery process** es un proceso completo, tan complejo como se necesite, que sirve de base para un tipo de proyecto. El **capability pattern** es un fragmento de proceso **reutilizable** más de una vez dentro de un delivery process. La **actividad** es el elemento central, que organiza roles, productos de trabajo y tareas. Y la **tarea** es la porción **más pequeña** de trabajo del modelo.

Un ejemplo recorre los cuatro niveles: el ciclo de vida típico de RUP contiene la disciplina *Entorno*, que contiene la actividad *Preparar el entorno para el proyecto*, que contiene la tarea *Personalizar el proceso de desarrollo para el proyecto*.

9.3 Los elementos del proceso en RUP

RUP (*Rational Unified Process*) es un proceso iterativo e incremental construido sobre SPEM. Sus elementos son los siguientes.

Fase. El ciclo de vida se descompone en fases, y cada fase es un **período de tiempo entre dos objetivos importantes**. RUP tiene cuatro: **Concepción** (o Inicial), **Elaboración**, **Construcción** y **Transición**.

Disciplina. Una **categorización de tareas** según la similitud de sus preocupaciones y la cooperación del esfuerzo. RUP tiene nueve: modelado de negocio, requisitos, análisis y diseño, implementación, prueba, despliegue, configuración y gestión de cambios, gestión de proyectos, y entorno.

Las fases y las disciplinas son dos ejes distintos: las fases **ordenan el tiempo**, las disciplinas **agrupan el tipo de trabajo**. Por eso se cruzan, y a lo largo de las fases se trabaja en varias disciplinas a la vez.

Actividad. Agrupa lógicamente elementos de proceso relacionados. **Una disciplina tiene una o más actividades, y una actividad tiene una o más tareas.**

Tarea. Describe una **unidad de trabajo**. La llevan a cabo **roles específicos**, dura entre **unas horas y unos días**, suele afectar a uno o pocos productos de trabajo y puede desglosarse en **pasos**. Una tarea bien descripta reúne el **rol responsable**, los **productos de trabajo de entrada y de salida**, y las guías que la apoyan: **directrices, plantillas y listas de comprobación**.

Ejemplo: la tarea *Desarrollar la visión* la ejecuta el **analista de sistemas**; toma como entrada las **solicitudes del interesado** y produce como salida la **visión**. Sus pasos son acordar el problema, identificar a los interesados, definir los límites del sistema, identificar las restricciones, formular el problema y definir las características del sistema. La apoyan la directriz *Entrevista*, la plantilla *Visión* y la lista de comprobación *Visión*.

Rol. Un conjunto de **habilidades, competencias y responsabilidades** relacionadas: analista de sistemas, arquitecto de software, diseñador, revisor técnico.

Producto de trabajo. Un **resultado significativo del proceso**: los roles los usan para realizar tareas y los producen al realizarlas. Hay tres tipos:

TIPO	QUÉ ES
Artefacto	Un producto tangible , no trivial: un documento, un modelo, el código
Resultado	Un producto intangibile : un estado o una consecuencia del trabajo
Entregable	Un empaquetado de otros productos de trabajo, que se entrega a una parte interna o externa

9.4 Las guías

Una **guía** es todo contenido cuyo objetivo principal es **explicar otros elementos** del proceso. RUP enumera nueve tipos —conceptos, directrices, materiales de soporte, documentación, plantillas, listas de comprobación, ejemplos, informes y guías de herramientas— y la presentación de la cátedra desarrolla ocho:

GUÍA	QUÉ ES
Plantilla	La estructura de un producto de trabajo: secciones, formato y cómo completarlas
Directriz	Indicaciones sobre cómo hacer algo concreto; se aplica a tareas y productos de trabajo
Lista de comprobación	Elementos que deben completarse o verificarse ; se usa en revisiones e inspecciones
Ejemplo	Una instancia parcialmente completa de un producto, para mostrar cómo queda
Concepto	Una idea fundamental , más general que una directriz
Guía de herramientas	Cómo usar una herramienta específica para producir parte de un producto
Documentación	Documentos publicados fuera de RUP a los que el proceso hace referencia
Informe	Un resultado generado automáticamente por una herramienta a partir de otros productos

Las guías se conectan con el capítulo anterior: una plantilla, una directriz o una lista de comprobación de la organización son **activos**, y el documento que se produce al usarlas en un proyecto es un **producto de trabajo**.

10. El proyecto y su planificación

10.1 Qué es un proyecto

Proyecto: conjunto de actividades coordinadas y controladas, con **inicio y fin definidos**, que crea un producto o servicio **único** conforme a requisitos específicos, dentro de límites de tiempo, coste y recursos. Se desarrolla **en pasos**, en lo que se llama elaboración gradual.

Tres precisiones que se derivan de la definición. Un proyecto **siempre tiene fin**: lo que no termina no es un proyecto sino una operación. Los proyectos de software **no son sólo de desarrollo**: existen los de **mantenimiento** y los de **despliegue o implantación**, y la categoría cambia qué tareas entran en la planificación. Y tener un diagrama de Gantt **no es tener un plan de proyecto**: el Gantt es una vista del cronograma, mientras que el plan incluye alcance, estimaciones, recursos, riesgos, calidad y comunicación.

La contracara del proyecto es el **proceso**, que es **repetitivo y reiterativo** y **produce siempre el mismo producto**. Esa repetibilidad es exactamente lo que el proyecto no tiene.

10.2 PP – Planificación de proyecto

Es un área de **nivel 2** y se encarga de cuatro cosas: desarrollar el plan, interactuar con las partes interesadas, **obtener el compromiso** con el plan, y mantenerlo.

La planificación arranca **con los requerimientos**, que son los que definen producto y proyecto. A partir de ahí se estiman los atributos de los productos de trabajo y de las tareas, se determinan los recursos, se elabora el calendario y se **identifican y tratan los riesgos**.

Un punto que suele pasarse por alto: **el plan necesitará corregirse** a lo largo del proyecto, y eso no es un fracaso de la planificación. Cambian los requerimientos, cambian los compromisos y las estimaciones resultan inexactas.

Sus tres metas son **establecer estimaciones** (alcance, atributos, ciclo de vida, esfuerzo y coste), **desarrollar un plan de proyecto** (presupuesto y calendario, riesgos, gestión de datos, recursos, conocimientos y habilidades, involucración de los interesados) y **obtener el compromiso con el plan** (revisar los planes que lo afectan, reconciliar niveles de trabajo y recursos, obtener el compromiso).

ATENCIÓN La planificación **incluye** estimar las tareas, determinar los recursos e identificar los riesgos. **No incluye** el pago a los recursos ni la especificación detallada de la arquitectura del software, que corresponde a **TS** (Solución técnica).

10.3 PMC – Monitorización y control del proyecto

También es de **nivel 2**, y su propósito es proporcionar una comprensión del progreso del proyecto para poder tomar **acciones correctivas apropiadas** cuando el rendimiento se desvía significativamente del plan.

El progreso se mide comparando la calidad de los productos de trabajo, el esfuerzo, el coste y el calendario **reales contra el plan**, en los **hitos o niveles de control** definidos en la EDT. Si hay desvío, las acciones correctivas posibles son la **replanificación**, el establecimiento de **nuevos acuerdos**, o la inclusión de **actividades adicionales de mitigación** dentro del plan actual.

Desvío significativo: aquel que, si se deja sin resolver, **impide al proyecto cumplir sus objetivos**. Por eso es falso que cualquier desvío deba resolverse: el modelo pide criterio, no reacción automática.

Sus dos metas son **monitorizar el proyecto frente al plan** —parámetros de planificación, compromisos, riesgos, gestión de datos, involucración de los interesados, revisiones de progreso y revisiones de hitos— y **gestionar las acciones correctivas hasta su cierre**: analizar problemas, llevar a cabo las acciones correctivas y gestionarlas.

Los **puntos de control y monitoreo se definen durante la planificación**, no durante la ejecución. En ejecución se usan.

ATENCIÓN Para distinguir PP de PMC en un enunciado, fíjate dónde está la reunión respecto del momento narrado. Si la reunión está **en el futuro** —"para informarlo en la reunión donde se juntará por primera vez todo el equipo"— todavía se está planificando: es **PP**. Si la reunión **ya ocurrió** —"en la última reunión de avance..."— se está monitorizando: es **PMC**.

10.4 Los diez grupos de procesos de gestión

La guía práctica de gestión de proyectos organiza el trabajo en diez grupos. Vale la pena tener presente a cuál pertenece cada proceso, porque los ejercicios juegan con procesos que suenan a un grupo y pertenecen a otro.

GRUPO	PROCESOS
Coordinación	Iniciar el proyecto · Desarrollar el plan · Gestionar la ejecución · Supervisar el trabajo · Control integrado de cambios · Cerrar el proyecto
Alcance	Definir el alcance · Definir las actividades · Controlar y verificar el alcance
Tiempo	Establecer la secuencia de actividades · Estimar la duración · Desarrollar el cronograma · Controlar el cronograma
Costes	Estimar los costos · Elaborar los presupuestos · Controlar los costos
Calidad	Planificar la calidad · Aseguramiento de calidad · Control de calidad
Recursos	Planificar los recursos · Controlar los recursos
Personal	Definir el equipo del proyecto · Gestionar el equipo
Comunicación	Planificar las comunicaciones · Gestionar la información y los interesados
Riesgos	Planificar la gestión · Identificar · Analizar · Planificar la respuesta · Controlar
Adquisiciones	Planificar las adquisiciones · Planificar la contratación · Solicitar respuesta a proveedores · Seleccionar proveedores · Administrar el contrato · Cerrar el contrato

Tres detalles que se preguntan. **Definir las actividades** pertenece a **Alcance**, no a Tiempo, aunque suene a cronograma. **Desarrollar el cronograma** debe identificar explícitamente el **camino crítico**, que es el de mayor duración en la red de actividades, y de ahí salen las actividades críticas y los hitos. Y **definir el equipo del proyecto** consiste en determinar **roles y responsabilidades**; no incluye estimar el esfuerzo por rol ni controlar el cronograma.

10.5 La EDT, las precedencias y el esfuerzo

La secuencia de trabajo es siempre la misma: se arma la **EDT**, se identifican las **tareas típicas** del ciclo de vida elegido, y se establecen las **órdenes de precedencia** entre ellas.

Dos cosas a tener claras al leer una red de tareas.

Una **predecesora directa** es la inmediatamente anterior. Si A precede a B y B precede a C, entonces A **no** es predecesora directa de C, aunque tenga que ocurrir antes.

Los **módulos independientes arrancan en paralelo**. Si un producto se compone de tres módulos independientes X, Y y Z, las tareas que dan inicio al proyecto son **tres**: analizar X, analizar Y y analizar Z.

ATENCIÓN Esfuerzo y duración no son lo mismo y no se suman igual. El **esfuerzo** se mide en días-persona u horas-persona y **se suma**. La **duración** se mide en días o meses y **no se suma**, porque las tareas de módulos independientes corren en paralelo. Una tarea puede durar 2 días y consumir 3 días-persona, si hay dos personas trabajando parte del tiempo. Cuando un ejercicio pide esfuerzo, hay que leer la columna de esfuerzo y convertir: 1 día-persona = 8 horas.

11. La estimación del esfuerzo

Estimar es decidir cuánto va a costar algo que todavía no existe. La materia presenta cuatro métodos, que no compiten entre sí: se usan en momentos distintos y con información distinta.

El **valor esperado**, o **técnica de tres puntos**, estima cada tarea en tres escenarios —optimista, normal y pesimista— y los combina en un único valor. La fórmula estándar pondera el escenario normal por cuatro: $(O + 4N + P) / 6$. Es rápida y sirve cuando la incertidumbre está acotada.

Delphi es una estimación **grupal e independiente de expertos**: cada uno vuelca su perspectiva en números sin ver la del resto. Es **iterativa**, y en cada vuelta se suma información buscando la **convergencia**. Sirve cuando no hay datos históricos pero sí gente con experiencia.

Los **puntos de función** miden el tamaño del software desde una perspectiva funcional, independiente de la tecnología. Se parte de la lista de requerimientos, se categoriza la funcionalidad y se aplica la metodología que se detalla abajo. Son una medida **indirecta del tamaño**, no del esfuerzo: el esfuerzo se deriva después.

Los **puntos de historia** son la estimación relativa de las metodologías ágiles.

Un consejo que la cátedra repite: **tomar nota de las decisiones tomadas**, sobre todo en la etapa de estimación. Es lo que después permite explicar un desvío en PMC en lugar de improvisar una justificación.

11.1 La distribución 40-20-40

Es una regla de reparto del esfuerzo total de un proyecto: **40 % análisis y diseño** —de los cuales 10 a 15 puntos van al análisis y 25 a 30 al diseño—, **20 % codificación** y **40 % pruebas**.

La lectura que importa no es el número exacto sino su consecuencia: **codificar es apenas la quinta parte del proyecto**, y se prueba tanto como se analiza y diseña junto.

11.2 Análisis de puntos función

El método tiene tres etapas.

Primero se identifican y clasifican los componentes, después de fijar el **límite del sistema**, que determina qué queda adentro y qué es externo. Los componentes son cinco: **entradas** (datos que cruzan el límite hacia adentro), **salidas** (datos que lo cruzan hacia afuera), **consultas** (combinación de entrada y salida para obtener datos), **ficheros lógicos internos** o FLI (datos que residen dentro de la aplicación y son actualizados por las entradas) y **ficheros de interfaz externos** o FIE (datos que residen fuera y son mantenidos por otra aplicación).

Segundo se pondera cada componente según su complejidad, que se establece por la diversidad de atributos en tipo y cantidad:

COMPONENTE	BAJA	MEDIA	ALTA
Entradas	3	4	6
Salidas	4	5	7
Consultas	3	4	6
Ficheros internos (FLI)	7	10	15
Ficheros externos (FIE)	5	7	10

La suma da los **PFD**, puntos función sin ajustar.

Tercero se aplica el factor de ajuste, que incorpora características no funcionales del entorno. Se califican **14 características** de 0 a 5 —comunicaciones de datos, procesamiento distribuido, rendimiento, utilización masiva, tasa de transacción, entrada de datos on-line, eficiencia para el usuario, actualización on-line, procesamiento complejo, reutilización, facilidad de instalación, facilidad de operación, puestos múltiples y facilidad de cambio—. La suma de los 14 valores es el **TDI**, que va de 0 a 70:

$$\begin{aligned} \text{Factor de ajuste} &= 0,65 + (\text{TDI} / 100) \\ \text{PF ajustados} &= \text{PFD} \times \text{Factor de ajuste} \end{aligned}$$

Con el TDI entre 0 y 70, el factor va de **0,65 a 1,35**: el ajuste puede mover el tamaño estimado hasta un 35 % para cada lado.

El temario incluye también el **glosario** de la guía de puntos función. Los términos que conviene reconocer son: **PFD**, puntos función sin ajustar; **PFM**, puntos función de la mejora (cuando se mide un cambio sobre una aplicación existente); **PFDM**, puntos función sin ajustar de la mejora; **PFP**, puntos función de las pruebas; **fichero referenciado**, un fichero lógico interno leído o modificado por una transacción, o un fichero de interfaz externo leído por ella; y **factor de impacto**, el grado de cambio que sufre una función.

12. Los ciclos de vida

Elegir un ciclo de vida es decidir **cuándo** se hace cada cosa, y esa decisión determina cuándo se detectan los defectos y cuánto cuesta corregirlos.

CICLO	CÓMO FUNCIONA	CUÁNDO CONVIENE
Casca-da	Cada etapa espera a que termine la anterior. Las pruebas van al final	Requerimientos conocidos y estables ; mantenimiento correctivo corto. Es el que menos sirve con requerimientos inestables : cerrado el análisis, los cambios no se contemplan hasta terminar las pruebas
Modelo en V	Integra verificación y validación desde las primeras fases , en paralelo al desarrollo: cada etapa tiene su nivel de prueba asociado	Cuando se quiere detectar defectos temprano sin abandonar la estructura secuencial
Incremental	Secuencias lineales escalonadas; cada una produce un incremento . Cada incremento es una mini-cascada completa con análisis, diseño, código y prueba	Cuando hay que salir a producción antes de tener todo terminado
Iterativo	Pasadas sucesivas sobre el producto, más flexible que el incremental: no espera a terminar una fase para empezar otra	Requerimientos no estabilizados
Espiral	Las características evolucionan : prototipo, prueba, rediseño y prototipado continuos	Cuando el equipo no puede especificar por adelantado . Riesgo: entregar como final un prototipo que no está listo
Prototipado	Recolección de requisitos, diseño rápido de lo visible para el usuario, construcción, evaluación del cliente, refinamiento	El cliente define objetivos generales pero no los requisitos detallados . Reduce el riesgo de subestimar el esfuerzo

La desventaja crítica de la cascada es que concentra las pruebas al final, de modo que los defectos se detectan cerca de la implementación, que es donde más caro sale corregirlos. El modelo en V nace como respuesta a esa limitación.

En un ciclo **incremental** vale la pena subrayar algo que se pregunta seguido: como cada incremento es una cascada completa, **el análisis se hace en todos los incrementos y las pruebas de sistema también**, no solamente en el último.

13. Verificación y validación

13.1 La distinción

Es la pareja de conceptos más importante de la unidad y la más fácil de confundir, porque ambos son procesos de evaluación de productos, se ejecutan frecuentemente **de forma concurrente** y pueden compartir parte del entorno.

	VERIFICACIÓN (VER)	VALIDACIÓN (VAL)
Qué asegura	Que los productos de trabajo seleccionados cumplen sus requerimientos especificados	Que el producto se ajusta a su uso previsto cuando se sitúa en su entorno previsto
La pregunta	¿Estoy construyendo correctamente el producto?	¿Estoy construyendo el producto correcto ?
Contra qué contrasta	La especificación	La necesidad del usuario
Quién interviene	Es una cuestión interna	Involucra al cliente o usuario
Nivel CMMI	3	3

ATENCIÓN El criterio que resuelve cualquier caso es **contra qué se contrasta**, no quién lo hace ni en qué fase ocurre. Unas pruebas de sistema ejecutadas por el equipo de QA sobre el producto terminado son **verificación**, porque se contrastan contra la especificación. Unas pruebas de aceptación con clientes reales son **validación**. Las inspecciones y revisiones son **verificación**.

13.2 Qué se valida y cómo

La validación se aplica a los productos de trabajo —requerimientos, diseños, prototipos— y al producto y sus componentes. Se hace **temprana e incrementalmente**, no al final.

El entorno debe **representar el entorno previsto**, y puede usarse completo o sólo en parte. Los métodos posibles son la discusión con usuarios, las demostraciones de prototipos, las demostraciones funcionales, los **pilotos** de materiales de formación, las pruebas realizadas por los usuarios finales y el análisis mediante simulaciones o modelado.

Es validable más de lo que se suele pensar: requerimientos y diseños, el producto y sus componentes, las **interfaces de usuario**, los **manuals de usuario**, los **materiales de formación** y la documentación del proceso.

La **verificación es incremental**: empieza por la verificación de los requerimientos, sigue con los productos de trabajo a medida que evolucionan, y culmina con la verificación del producto terminado.

13.3 Metas y prácticas

VERIFICACIÓN (VER)

SG1 Preparar la verificación — SP1.1 Seleccionar los productos de trabajo a verificar · SP1.2 Establecer el entorno · SP1.3 Establecer procedimientos y criterios

SG2 Realizar revisiones entre pares — SP2.1 Preparar · SP2.2 Llevar a cabo · SP2.3 Analizar los datos

SG3 Verificar los productos seleccionados — SP3.1 Realizar la verificación · SP3.2 Analizar los resultados

VALIDACIÓN (VAL)

SG1 Preparar la validación — SP1.1 Seleccionar los productos a validar · SP1.2 Establecer el entorno · SP1.3 Establecer procedimientos y criterios

(VAL no tiene esta meta)

SG2 Validar el producto o los componentes — SP2.1 Realizar la validación · SP2.2 Analizar los resultados

ATENCIÓN Las **revisiones entre pares** existen sólo en **VER**. Si una opción atribuye a VAL la práctica "preparar las revisiones entre pares", esa opción es falsa aunque todo lo demás encaje.


13.4 El grado de confianza

Verificar y validar no busca la ausencia total de defectos —que es inalcanzable— sino que el software sea **suficientemente bueno para su uso previsto**. Cuánta confianza hace falta depende de tres factores.

La **críticidad del sistema**: un sistema crítico exige confianza alta; un prototipo, mucho menos. Las **expectativas del usuario**, que vienen subiendo porque la tolerancia a fallos decrece. Y el **entorno de mercado**: con pocos competidores una empresa puede lanzar antes de estar completamente probada para llegar primero, y con un precio bajo los clientes toleran más defectos.

Conviene recordar que V&V son **procesos costosos**: en ciertos sistemas superan **la mitad del presupuesto total** de desarrollo. Por eso se planifican desde etapas tempranas.

13.5 Inyección y remoción de defectos

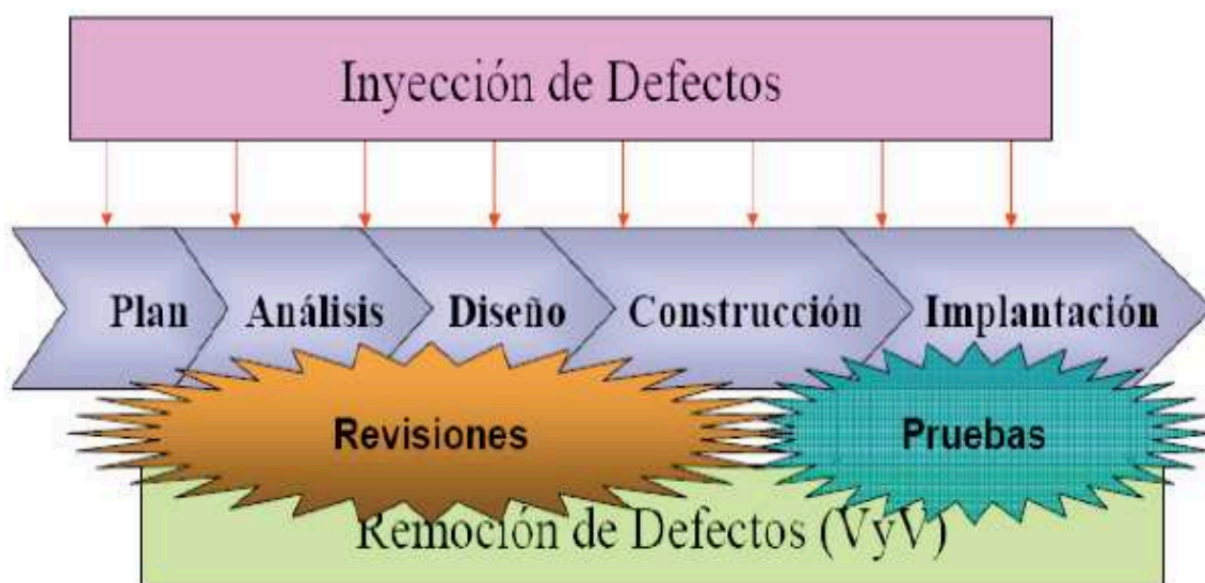

Los defectos **se inyectan en todas las fases** —plan, análisis, diseño, construcción e implantación—, no sólo al programar. Verificación y validación son el conjunto de actividades de **remoción**, y se reparten en dos franjas

que se solapan: las **revisiones**, que son estáticas, cubren desde el plan hasta la construcción; las **pruebas**, que son dinámicas, cubren desde la construcción hasta la implantación.

De ahí la regla económica que ordena toda la unidad: **corregir un defecto en mantenimiento cuesta alrededor de cien veces más que corregirlo en la etapa de requisitos**. Cuanto antes empiece V&V, más barato sale cada defecto.

14. La organización de las pruebas

14.1 Qué es un caso de prueba

Caso de prueba: conjunto de **entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados**, desarrollado para un objetivo o condición particular.

En su forma mínima se escribe como un par ordenado: (**valor de entrada** → **resultado esperado**). Sin resultado esperado no hay caso de prueba, porque no habría forma de saber si pasó o falló.

Nunca se prueba en producción: el entorno de pruebas debe estar **físicamente separado** y recrear las condiciones de producción.

14.2 Los cuatro niveles de prueba

NIVEL	QUÉ PRUEBA	QUIÉN Y CÓMO
Unitarias	Cada módulo o componente aislado, antes de integrar	El propio desarrollador , junto con el diseño y la construcción. Usa stubs y drivers para aislar el módulo
Integración	La interacción entre módulos ya integrados: defectos de interconexión	Se apoya en los documentos de análisis y sobre todo de diseño
Sistema	El comportamiento global contra la especificación funcional, incluyendo requisitos no funcionales	Un equipo independiente , con técnicas de caja negra y un entorno lo más parecido a producción
Aceptación	Que el producto satisface las necesidades del usuario	Lo realiza un usuario o cliente

Ningún nivel reemplaza a otro. Que haya pruebas de integración no quita que se hagan las unitarias, y viceversa.

Para armar la integración hay tres estrategias. **Big-bang** ensambla todo de una vez: no requiere simular nada, pero consume mucho tiempo rastreando causas y descubre los problemas al final. **Bottom-up** avanza desde los módulos inferiores: necesita **drivers** en cada nivel y no encuentra problemas de diseño hasta muy avanzado. **Top-down** avanza desde los componentes superiores: necesita **stubs** que simulen los inferiores, pero **descubre rápidamente los errores de arquitectura**.

Las pruebas de aceptación admiten tres modalidades: **alfa**, con un conjunto acotado de clientes preseleccionados en un entorno controlado; **beta**, con un conjunto más amplio; y **piloto**, con un conjunto reducido de departamentos del cliente y en **ambiente de producción**.

14.3 Tipos de prueba

El **nivel** indica cuándo y sobre qué parte se prueba; el **tipo** indica con qué objetivo. Los tipos que se nombran en la materia son las pruebas funcionales, las de prestaciones, las de usabilidad, las de seguridad o acceso, las de configuración, las de instalación y carga inicial de datos, y las de migración de datos.

Dentro de las de **prestaciones** conviene distinguir cuatro que se confunden. Las de **carga** validan los requisitos de prestaciones definidos con escenarios realistas. Las de **capacidad** buscan el **punto umbral** a partir del cual las prestaciones se degradan, incrementando la carga hasta la saturación. Las de **estrés** estudian el comportamiento **en sobrecarga**, excediendo los límites, con foco en la integridad. Las de **estabilidad** miran el comportamiento **en el tiempo** bajo carga normal, para detectar mala liberación de recursos.

14.4 Regresión y confirmación

Son dos actividades distintas que se ejecutan juntas después de cada corrección.

La **confirmación** verifica que **el defecto corregido realmente se solucionó**: misma prueba, mismas condiciones, mismos datos. La **regresión** verifica que **el arreglo no rompió otra cosa**.

La regresión puede detectar tres situaciones: que el cambio **creó un error nuevo** (regresión local), que el cambio **reveló errores que ya existían** (de exposición), o que el cambio en un área **rompió otra área** del sistema (remota). La estrategia más simple es la **fuerza bruta**, repetir todas las pruebas, y por eso la regresión es el mejor candidato a automatizarse.

14.5 Los diez principios de Myers

Son el marco de actitud con el que se encara el testing, y condensan buena parte de lo anterior.

1. Una parte **necesaria** de un caso de prueba es la definición de la **salida prevista**.
2. Un desarrollador debe evitar **probar su propio programa**.
3. El personal de prueba **no debería depender** del área de desarrollo.
4. **Inspeccionar los resultados** de la prueba.
5. Escribir casos **tanto para las condiciones de entrada esperadas como para las no esperadas**.
6. Examinar un programa para comprobar **que no hace lo que no se supone** que haga.
7. Evitar casos de prueba **desechables y sin documentar**: hay que guardarlos para reejecutarlos.
8. **No planificar** el esfuerzo de pruebas suponiendo que no se encontrarán errores.
9. La probabilidad de encontrar errores adicionales en una sección es **proporcional al número de errores ya encontrados** en esa misma sección.
10. Las pruebas son una tarea **altamente creativa** y un desafío intelectual.

Los principios 2 y 3 merecen desarrollo, porque suelen preguntarse. Hay tres razones por las que quien desarrolla no debe probar su propio código. La primera es de actitud: **desarrollar es un proceso creativo y probar es un proceso destructivo**, y cuesta cambiar de una mentalidad a la otra sobre el trabajo propio. La segunda es la **visión de túnel**: quien desarrolló entiende su código de raíz y tiende a probar los caminos que ya sabe que funcionan. La tercera es la más grave: si el error está en **cómo se entendió el requerimiento**, quien lo entendió mal va a probar según su propio malentendido; por eso se prueba también **con el cliente**.

El principio 9 tiene una consecuencia práctica directa: conviene concentrar el esfuerzo de corrección **en los módulos donde más defectos aparecieron**, porque es donde es más probable que sigan apareciendo.

15. Las técnicas dinámicas

Las técnicas dinámicas ejecutan el código y buscan **fallos**. Existen porque **no se puede probar exhaustivamente**: las combinaciones de entradas posibles son inabarcables. Cada técnica es una forma sistemática de elegir un subconjunto de casos con alta probabilidad de encontrar defectos.

Antes de ver cada una, conviene tener el criterio de selección, porque los enunciados suelen describir la situación y pedir la técnica:

LO QUE DICE EL ENUNCIADO	TÉCNICA
Un campo con rango, longitud o formato; "valores válidos e inválidos"	Partición de equivalencia o valores límite
"Todas las combinaciones", una matriz, reglas de negocio que se cruzan	Tablas de decisión
Una secuencia de estados, "pasa de X a Y"	Transición de estados
Flujo básico y flujos alternativos, escenarios de punta a punta	Pruebas de casos de uso
Se dispone del código, cobertura de sentencias o decisiones	Caja blanca
Volver a probar lo que ya funcionaba después de un cambio	Regresión

15.1 Particionamiento de equivalencia

La idea es agrupar las condiciones de entrada que **el sistema trata igual**. Si el programa funciona para un valor de la partición, se asume que funciona para todos; si falla para uno, se asume que falla para todos. Por eso alcanza con probar **un representante por partición**.

Las particiones se dividen en **válidas** —las que el sistema debe aceptar— e **inválidas** —las que debe rechazar—. Las directrices habituales son: un rango como "10 a 100" da una partición válida y **dos inválidas** (por debajo y por encima); un conjunto discreto como "ROJO, BLANCO, NEGRO" da una válida y una inválida; una condición de obligación como "letras mayúsculas" da una de cada una. También existen las **particiones de salida**, que agrupan por resultado en vez de por entrada.

El formato con el que se trabaja en la materia tiene dos tablas encadenadas. La primera declara el **atributo**, su **dominio** y las particiones válidas e inválidas. Para un campo "día del mes" con dominio entero positivo entre 1 y 31, y un recargo que cambia cada diez días:

PARTICIONES	
Válidas	PV1) $1 \leq X \leq 10$ · PV2) $11 \leq X \leq 20$ · PV3) $21 \leq X \leq 31$
Inválidas	PI1) letras · PI2) $X \leq 0$ · PI3) $X > 31$ · PI4) vacío · PI5) imagen · PI6) carácter especial · PI7) cadena de caracteres

La segunda lista los casos de prueba, con un representante por partición y una fila por caso: **Caso | Partición | Entrada | Salida esperada**. Con las particiones de arriba serían diez casos: tres válidos (1, 12, 30) y siete inválidos, uno por cada forma de entrada rechazable.

ATENCIÓN Dos errores arruinan este ejercicio. El primero es **olvidar las particiones intermedias**: si un sistema se activa "por encima de 25" y se apaga "por debajo de 20", entre 20 y 25 hay una zona donde no pasa nada, y esa zona **es una partición válida**. El segundo es **dejar que las particiones se pisen**: si la válida llega hasta 31, la inválida empieza en 32, o sea $X > 31$, no $X \geq 31$.

15.2 Análisis de valor de frontera

Es una **mejora** del particionamiento, no una alternativa. En vez de un solo representante por partición, prueba **más de un caso en cada una**, concentrados en los **extremos**, porque es donde se agrupan los errores.

Para un rango de 10 a 100 se prueban **9, 10, 100 y 101**. Para conjuntos ordenados, el primer y el último elemento. Hay valores especiales que conviene no olvidar: en minutos siempre 0 y 59; en fechas, los límites de mes y los **años bisiestos y no bisiestos**.

Para campos no numéricos el criterio cambia. Si el campo admite **una letra cualquiera**, alcanza un caso. Si admite un **conjunto cerrado** de N valores, va un caso por valor. Si es una **cadena de longitud fija**, se prueba con esa longitud exacta. Si acepta **hasta N caracteres**, van casos para las longitudes relevantes alrededor de N.

Cuando una consigna pide "cubrir todas las particiones válidas", pide **representantes**, no bordes. Cuando pide valores límite, pide los **extremos**. Es la diferencia entre las dos técnicas y es lo que se evalúa.

15.3 Tablas de decisión

Se usan cuando **múltiples combinaciones de entradas** producen resultados distintos. A diferencia de las anteriores, que miran un campo por vez, esta técnica se centra en **la lógica y las reglas de negocio** que cruzan varios campos.

La tabla tiene filas de **condición** y filas de **acción**, y **cada columna es una regla de negocio**, es decir, un caso de prueba.

Armarla tiene cuatro pasos. Se identifican las **condiciones**, que son los atributos que deciden el resultado. Se identifican las **acciones**, que son los resultados distintos que el sistema puede ejecutar. Se generan las **columnas**, combinando los valores posibles de cada condición. Y se **reduce** la tabla, eliminando las combinaciones imposibles y colapsando las indiferentes.

Un ejemplo que aclara el conteo. Un gimnasio tiene socios de categoría Coulson, IronMan (10 % de descuento) o Hulk (15 %), y quien tiene la cuota al día recibe un 5 % adicional acumulable. Las condiciones son dos: la categoría y el estado de la cuota. Pero la categoría **no es binaria**: tiene tres valores mutuamente excluyentes. Entonces las columnas son $3 \times 2 = 6$, y las acciones son **cuatro**: aplicar 0 %, 10 %, 15 % y el 5 % adicional.

ATENCIÓN El error típico es contar toda condición como binaria y calcular 2^n columnas. Una condición puede tener tres o más valores, y en ese caso el producto cambia. Y a la inversa: cuando hay **condiciones incompatibles** —si el usuario no existe, la contraseña es irrelevante—, las combinaciones se colapsan y quedan menos casos de los que sugiere la potencia de dos.

15.4 Transición de estados

Se aplica a sistemas modelables como **máquina de estados finitos**, donde la salida ante la misma entrada **depende del estado anterior**. El ejemplo canónico es un trámite que pasa de Inscripto a Cursando y de ahí a Aprobado o Desaprobado.

Partiendo de la máquina de estados, la técnica permite revisar qué hace falta para llegar a cada estado y detectar incompatibilidades: **transiciones que faltan**, o estados de los que no se puede salir.

Una prueba completa no se limita al camino feliz: debe incluir las **transiciones no válidas** —intentos fallidos, timeouts— y los **eventos no especificados**, como cancelar a mitad de camino.

15.5 Pruebas de casos de uso

Ejercitan el sistema **de punta a punta**, siguiendo el recorrido real de un usuario.

El proceso es: definir el **flujo básico**, que es el camino feliz, y los **flujos alternativos**; **derivar los escenarios**, donde cada escenario es el flujo básico más uno de los caminos alternativos; y escribir **un caso de prueba por escenario**, con identificador, condiciones de entrada y resultado esperado. Después se suman las especificaciones complementarias: rendimiento, seguridad, configuración e instalación.

Estos casos son de **mejor calidad** que los armados campo por campo, porque ejercitan el sistema como se usa de verdad: validar una tarjeta en un cajero contempla muchas más cosas que probar tres números sueltos en un formulario.

15.6 Caja negra y caja blanca

La distinción es qué información tiene quien prueba.

En **caja negra** sólo se ven entradas y salidas. Es rápida y no requiere acceso al código, pero cuando algo falla **no se sabe dónde está el error**. Todas las técnicas anteriores son de caja negra.

En **caja blanca** se dispone del **código fuente**, lo que permite saber cuántas sentencias y condiciones se ejecutaron y sacar un porcentaje de cobertura. Trabaja sobre tres estructuras: secuencia, selección e iteración.

TÉCNICA	OBJETIVO
Pruebas de sentencia	Ejecutar cada sentencia ejecutable al menos una vez
Pruebas de decisión	Evaluar cada decisión (IF-THEN-ELSE, DO-WHILE) en verdadero y falso
Pruebas de caminos	Recorrer cada camino de ejecución independiente. No prueba todas las combinaciones: con bucles serían infinitas

Conviene notar que un defecto puede manifestarse **aunque todas las sentencias se hayan ejecutado al menos una vez**, porque el problema aparece recién al **combinarse** ciertos caminos. La cobertura del 100 % de sentencias no garantiza ausencia de defectos.

15.7 Técnicas basadas en la experiencia

Se usan cuando **no hay una especificación adecuada** o **no hay tiempo**. La **adivinación de errores** complementa a las técnicas formales y depende de la habilidad e intuición del técnico. Las **pruebas exploratorias** consisten en recorrer el software para entender qué hace, qué no hace y dónde está débil, diseñando las pruebas mientras se ejecutan.

16. Las técnicas estáticas: revisiones

16.1 Por qué existen

Las técnicas dinámicas necesitan el sistema andando, y eso limita cuándo se pueden aplicar. Las **estáticas** analizan documentos —requisitos, diseños, código, historias de usuario— **sin ejecutar nada**, y por eso se pueden aplicar en **cualquier momento** del ciclo de vida. Buscan **defectos**, no fallos.

Son la **primera forma de prueba aplicable** en un proyecto, y están vinculadas principalmente a la **verificación**.

	ESTÁTICAS (REVISIONES)	DINÁMICAS (PRUEBAS)
Qué encuentran	Defectos	Fallos
Qué necesitan	Documentos	El sistema ejecutable
Cuándo se aplican	En cualquier momento	Sólo con el producto andando
Ventaja	Se sabe dónde está el problema; se encuentran varios a la vez; se corrige temprano	Más rápidas de ejecutar
Desventaja	Más lentas	No se sabe dónde está el error

Son **complementarias**: ninguna reemplaza a la otra.

16.2 Beneficios y costo

Las revisiones mejoran la calidad y la comprensión de los entregables, validan que soportan la solución final, gestionan las expectativas del negocio, identifican tareas de alto riesgo y forman al equipo. Al reducir los errores que llegan a la etapa de pruebas, **acortan los períodos de prueba y bajan sus costos**.

Aun así, muchas organizaciones no las implementan, y la explicación que da la materia es que tienden a **sobreestimar su costo y subestimar sus beneficios**.

16.3 Formalidad

Una revisión puede ser informal o formal, y la diferencia está en si hay proceso.

Las **informales** no tienen proceso definido, no tienen roles y habitualmente no se planean. Cualquier intercambio entre pares cuenta: preguntarle a un compañero si le parece bien un pedazo de código es una revisión informal.

Las **formales** tienen objetivos definidos, proceso documentado, roles asignados a personas entrenadas, checklists y reglas, **reporte de resultados** y recolección de datos para el control del proceso.

La formalidad importa porque deja **trazabilidad documentada** de las acciones y decisiones, lo que permite demostrar después que los procedimientos se cumplieron.

16.4 El proceso y los tipos

El proceso básico es común a todas: se identifican los entregables a revisar, se arma la lista de participantes, los revisores **estudian** el documento por su cuenta, identifican problemas y se los **comunican al autor**, y el autor **responde y actualiza**.

TIPO	QUIÉN LO DIRIGE	FOCO	FORMALIDAD
Revisión informal	—	Encontrar defectos; documentar es opcional	Mínima
Walkthrough	El propio autor	Entendimiento común, evaluar contenidos, discutir alternativas	Media
Revisión técnica	Un moderador capacitado o experto técnico	Consenso técnico , con revisores expertos; no es búsqueda de defectos	Variable
Revisión entre pares	Colegas del mismo proyecto	Identificar y eliminar defectos temprano , de forma incremental	Media
Inspección	Un moderador formado, nunca el autor	Registrar defectos eficientemente: las discusiones se posponen. Seguimiento formal con criterios de salida	Máxima

16.5 Los cinco roles

El **moderador** dirige el proceso, determina junto con el autor el tipo de revisión y la composición del equipo, y hace el seguimiento. El **autor** creó el documento y busca mejorar su calidad. El **documentador** anota cada defecto y sugerencia. El **revisor** valida el material buscando defectos **antes** de la reunión. El **supervisor** decide destinar tiempo del proyecto a las revisiones y determina si se cumplieron los objetivos.

Las guías para que una revisión entre pares funcione son concretas: crear un **entorno seguro y no amenazante**, capacitar al personal en sus roles, **documentar los defectos** con ubicación y descripción, **enfocarse en el producto y no en la persona**, y **incluir las revisiones en la planificación del proyecto** para que tengan tiempo asignado.

16.6 Análisis estático

Es la variante automatizada: busca defectos **sin ejecutar** el programa, pero **una vez escrito el código**, con herramientas llamadas analizadores estáticos.

Detecta variables **no inicializadas**, variables **no utilizadas**, **código inalcanzable**, inconsistencias entre módulos, vulnerabilidades de seguridad y violaciones de los estándares de programación. Encuentra además inconsistencias en los modelos, algo que las pruebas dinámicas no pueden hacer.

Entre las métricas de código que produce, la más usada es la **complejidad ciclomática**, que se calcula como el número de sentencias de decisión binarias más uno y sirve para **estimar cuántas pruebas** necesita un componente.

17. Confusiones frecuentes

Para cerrar, las confusiones que más se repiten. No son trucos de examen: cada una es un concepto mal entendido.

Sobre CMMI. Creer que las prácticas son obligatorias, cuando lo requerido son **sólo las metas**. Creer que alcanzar un nivel superior exime de las metas de los niveles anteriores, cuando los niveles son **acumulativos**. Atribuir a MA el repositorio de medidas de la organización, que es de **OPD** porque es un activo organizacional. Confundir OPF con OPD: **OPF diagnostica y despliega**, **OPD define y guarda**. Y creer que OT es de nivel 4 por la errata de la traducción: es de **nivel 3**.

Sobre verificación y validación. Clasificar como validación todo lo que se hace sobre el producto terminado: unas pruebas de sistema son **verificación**, porque se contrastan contra la especificación. Atribuir a VAL las **revi-**

siones entre pares, que existen sólo en VER.

Sobre las pruebas. Olvidar las **particiones intermedias**, la zona donde el sistema no hace nada. Confundir partición de equivalencia con valores límite: la primera pide **un representante por partición**, la segunda pide los **bordes**. Contar toda condición de una tabla de decisión como **binaria**, cuando puede tener tres o más valores.

Sobre la gestión de proyectos. Sumar **duración** donde se pide **esfuerzo**: el esfuerzo se suma, la duración no. Olvidar que los **módulos independientes arrancan en paralelo**, y que por lo tanto puede haber varias tareas de inicio. Y creer que **cualquier desvío** debe resolverse, cuando lo que exige el modelo es actuar sobre los **significativos**.
